


Umgestaltung Inselbadstadion Paderborn

Neubau Funktionsgebäude

Aufgestellt am 08.06.2011

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vo	Ressourc	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
					KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 3
1	1 Bauwerksgründung	39 Tage?													
2	1.1 Vermessungsarbeiten	3 Tage?	1.1 Stadt												
3	1.2 Erdarbeiten, Abtrag auf Gründungsniveau	4 Tage	1.2. Blechl												
4	1.3 Kampfmittelbeseitigung	4 Tage	1.3 lutom												
5	1.4 Sondierung / Freigabe Kampfmittelbeseitigung	5 Tage	1.4 Luton												
6	1.5 Spezialtiefbau	5 Tage	1.5 DYNIV												
7	1.6 Bodengutachter	2 Tage	1.6 Kleeg												
8	1.7 Rohbauarbeiten bis zur Sohle	20 Tage	1.7 Bleck												
9															
10	2 Rohbauarbeiten	50 Tage													
11	2.1 Stahlbetonfertigteilmontage	20 Tage	2.1 Brem												
12	2.2 Gerüstbauarbeiten	2 Tage	2.2												
13	2.3 Schlosserarbeiten	3 Tage	2.3												
14	2.4 Trapezblecharbeiten	4 Tage	2.4												
15	2.5 Dachdecker- und Klempnerarbeiten	10 Tage	2.5												
16	2.6 Mauerarbeiten	5 Tage	2.6 Bleck												
17	2.7 Dichtungsarbeiten Außenwände	2 Tage	2.7												
18	2.8 Außenfenster	5 Tage	2.8												
19															
20	3 Haustechnik	50 Tage													
21	3.1 Heizungsbauarbeiten	15 Tage	3.1												
22	3.2 Sanitärinstallationsarbeiten	15 Tage	3.2												
23	3.3 Lüftungsbauarbeiten	10 Tage	3.3												
24	3.4 Blitzschutzarbeiten	3 Tage	3.4												
25	3.4 Feininstallation	5 Tage	3.5												
26															
27	4 Innenaubau	52 Tage													
28	4.1 Abdichtung EG-Sohle	2 Tage	4.1												
29	4.2 GK-Metallständerwände	5 Tage	4.2												
30	4.3 Türzargen und FH-Türen	3 Tage	4.3												
31	4.4 Rolltore	1 Tag	4.4												



Projekt: Funktionsgebäude IBS-PB_1
Datum: Mi 22.06.11

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

Umgestaltung Inselbadstadion Paderborn

Neubau Funktionsgebäude

Aufgestellt am 08.06.2011


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vo	Ressourc	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
					KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 3	
32	4.5 Außen- und Metallinnentüren	3 Tage		4.5												
33	4.6 Estricharbeiten	7 Tage		4.6												
34	4.7 Fliesenarbeiten	15 Tage		4.7												
35	4.8 Abgehängte Decken und GK-Vorsatzschalen	6 Tage		4.8												
36	4.9 Malerarbeiten	10 Tage		4.9												
37	4.10 WC-Trennwände	2 Tage		4.10												
38	4.11 Innentüren	3 Tage		4.11												
39																
40	5 Abnahme und Mängelbeseitigung	6 Tage														
41	5.1 Endabnahme aller Gewerke	1 Tag		5.1												
42	5.2 Mängelbeseitigung aller Gewerke	5 Tage		5.2												
43																
44	6 Endabnahme und Übergabe an den Bauherrn	1 Tag														
45	6.1 Schlüsselübergabe	1 Tag		5.3												

Projekt: Funktionsgebäude IBS-PB_1
Datum: Mi 22.06.11


Vorgang 

Unterbrechung 

In Arbeit 

Meilenstein 

Sammelvorgang 

Projektsammelvorgang 

Externe Vorgänge 


Externer Meilenstein 

Stichtag 

Umgestaltung Inselbadstadion Paderborn

Neubau Funktionsgebäude

Aufgestellt am 08.06.2011

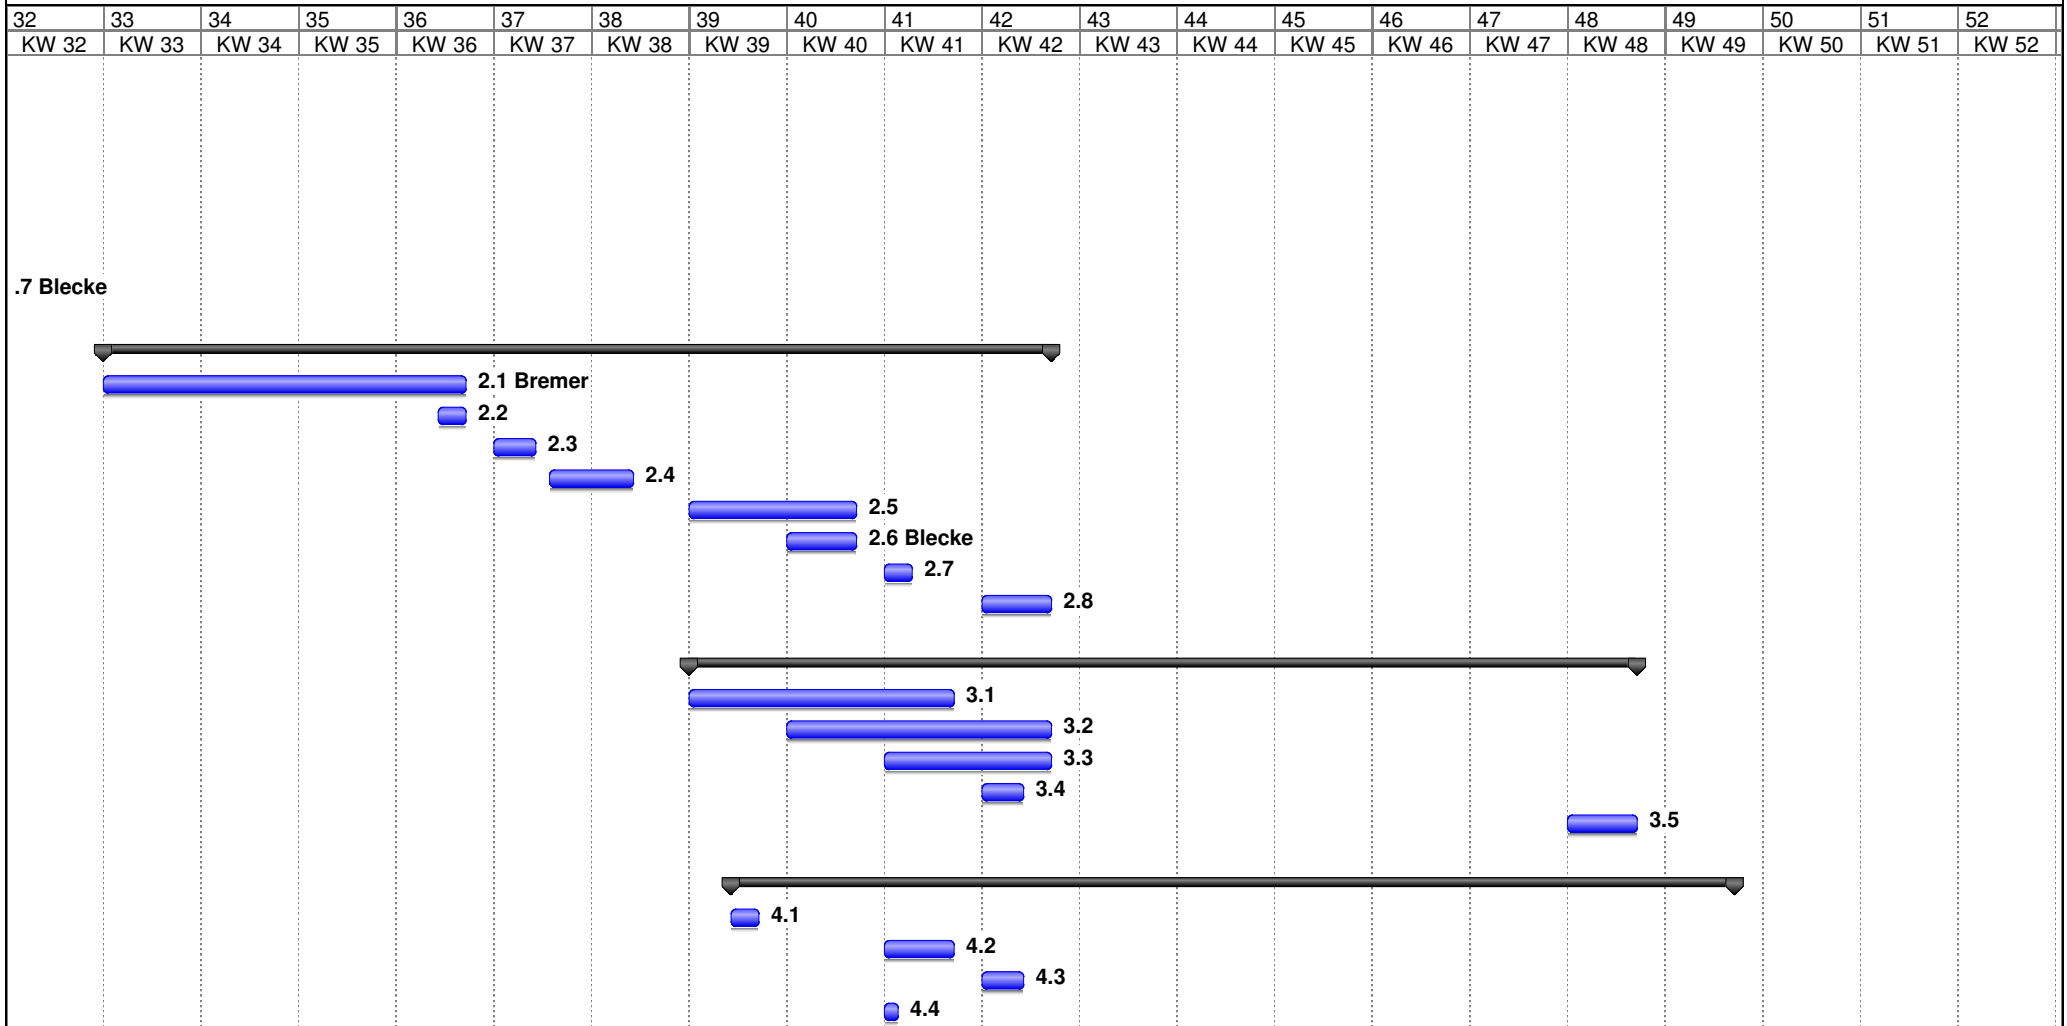

Projekt: Funktionsgebäude IBS-PB_1 Datum: Mi 22.06.11	Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

